

玉里地区小中一貫教育学校

【第15号】

建設準備委員会だより



このたよりは、玉里地区の小中一貫校の開校に向けた準備の情報をお届けするものです。今号では、第15回建設準備委員会の様子をお知らせします。

第15回建設準備委員会を開催

1月31日(水)に第15回建設準備委員会を開催し、右記のことについて協議を行いました。

【議事内容】

工事全体計画(案)について



配置計画案及び平面計画案の修正点

第14回建設準備委員会であった意見を基に、配置計画案及び平面計画案の修正を行いました。

■第14回準備委員会における意見及び修正点

- ①管理エリアからサブグラウンドが見えない
⇒ 学校運営にて対応、校舎内から見守ることができるスペースの確保(平面計画図)
- ②教室を広めに設定してほしい
⇒ 廊下側を広げ(2㎡程度)ゆとりを確保
- ③廊下の幅は、広くしない方がよい
⇒ 現計画のとおり
- ④武道場を設置してほしい
⇒ 今までの運用どおり(既設体育館利用)
- ⑤2階玄関と既設体育館への動線が交差するのは、よくない ⇒ 平面計画を変更(平面計画図)
- ⑥水はけのよいグラウンドにしてほしい
- ⑦階段の蹴上げ部分の隙間をなくしてほしい
- ⑧中学部の2階アプローチを水はけのよい素材にしてほしい ⇒ (⑥⑦⑧) 実施設計において考慮

■その他の修正点


- ⑨体育館北側の土地を取得し、駐車場及び校内通路として利用(配置計画図)
- ⑩普通教室エリア階段周辺の配置変更(平面計画図)



平面計画図
(修正点抜粋)




2階

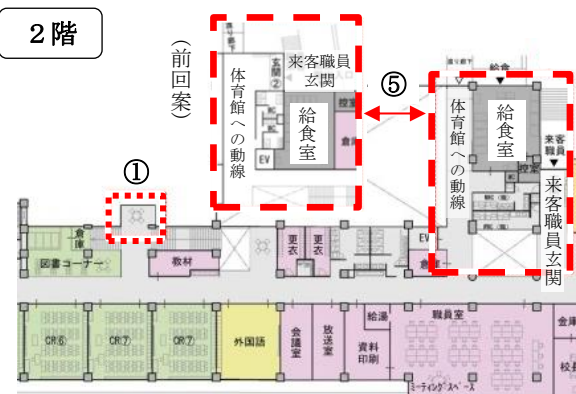

工事全体計画(案)について

これまで協議してきた内容に基づいた工事全体計画案について協議を行いました。平成33年4月の開校に向け、平成30年から平成34年に亘る5年間で施設整備を行う計画です。

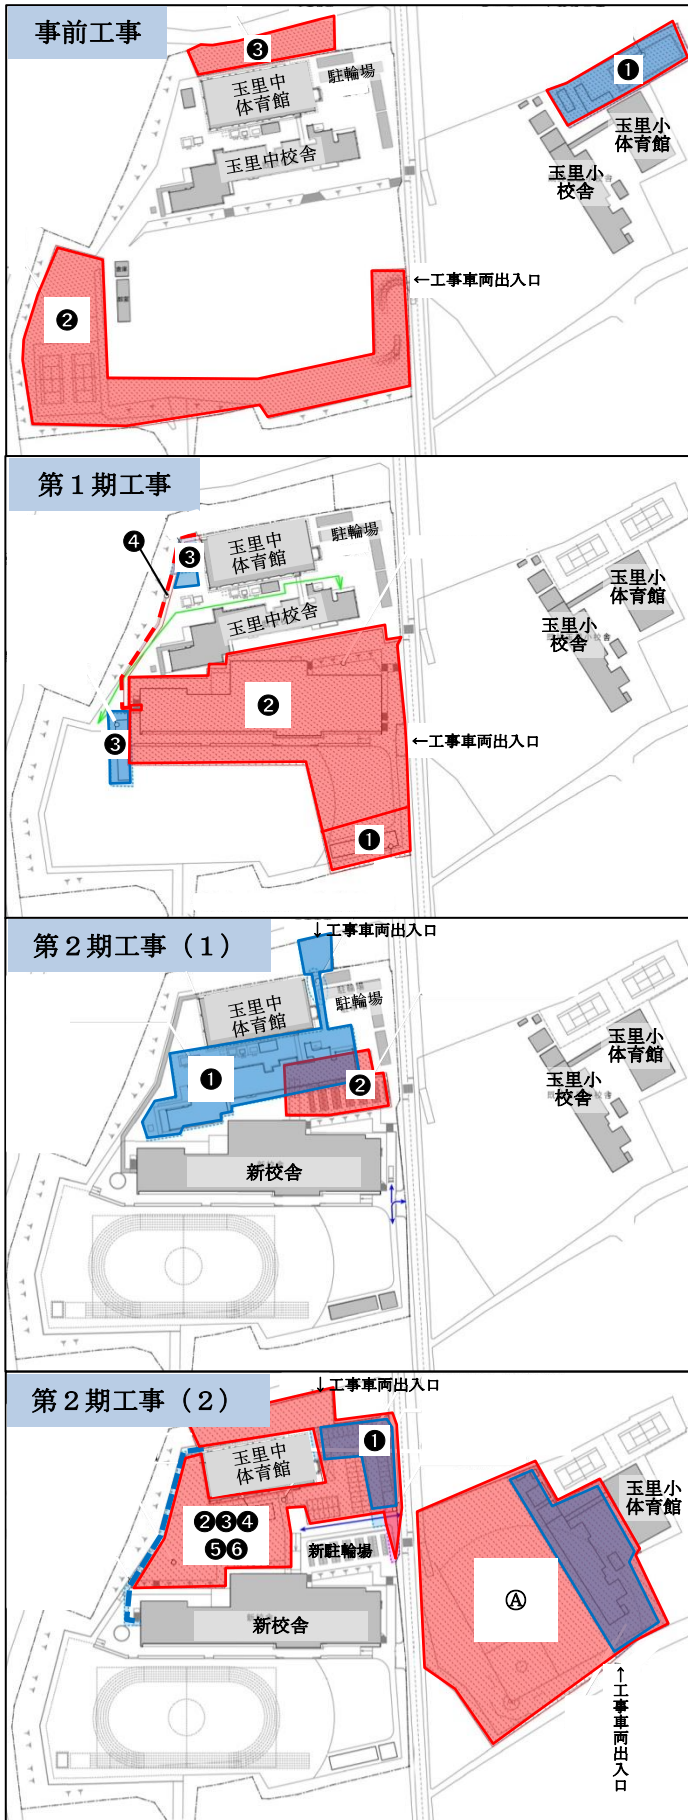

- 事前工事 平成30年度**
- ① プール解体、テニスコート新設
 - ② グラウンド拡張
 - ③ 体育館裏隣接地造成

- 第1期工事 平成31年度～32年度**
- ① 倉庫、屋外トイレ、部室新設
 - ② 新校舎建設
 - ③ 倉庫、部室解体
 - ④ 仮設渡り廊下設置

- 第2期工事(1) 平成33年4月～9月**
- ① 玉里中校舎解体
 - ② 新設駐輪場周辺整備

- 第2期工事(2) 平成33年10月～34年3月**
- ① 駐輪場解体
 - ② サブグラウンド整備
 - ③ 児童クラブ建設
 - ④ 新設渡り廊下設置
 - ⑤ 仮設渡り廊下撤去
 - ⑥ 外構
 - ①A 玉里小校舎解体、グラウンド整備

○主な意見、質問

・ 現玉里小学校のプールは、底の塗装がはがれてきてしまい、子供たちが足の裏を怪我してしまうことが何件もあった。B & G海洋センターのプールを借りて水泳の授業を行った方が良いかと考えている。来年度は、B & G海洋センターで授業を実施したい。

・ 子供たちの登下校と重ならないように大型車両等が入ってくるようになれば良い。

・ 児童クラブ建設工事、サブグラウンド整備工事と玉里小校舎解体工事の時期が重なっている。その間の児童クラブ利用者は、どのようになるのか。
⇒ (事務局) 新校舎の教室も含め、場所を検討していく。

※会議の議事録等は、市ホームページで公開しています。
<http://city.omitama.lg.jp/0025/genrel-2-001.html>



今回の建設準備委員会は、来年度を予定しています。日程が決まり次第、市ホームページでお知らせします。

発行：玉里地区小中一貫教育学校建設準備委員会
(事務局) 小美玉市教育委員会 施設整備課
学校づくり推進係
〒311-3492 小美玉市小川4-11
電話 0299-48-1111 (内線2212・2216・2217)
Eメール shisetsu@city.omitama.lg.jp
